

建设工程施工过程跟踪审核周报

编号: 武华【2024】065

工程名称	武汉学院二期体育馆项目	建设单位	武汉学院
施工单位	武汉建工	监理单位	湖北新天地工程建设监理有限责任公司
咨询内容	第（65）期周报		
咨 询 单 位 意 见	一、项目概况 体育馆项目位于东门北侧，地下1层，地上2层，夹层1层，建筑总高度22.2米。体育馆规划总建筑面积23797.34m²，其中地上建筑面积13795.46m²，地下体育用房4204.54m²，场地架空1664.88m²，地下停车及设备房4132.46m²。 本期2025年7月14日至2025年7月20日，屋面钢构，9轴天窗架及门架焊接:11轴门架安装，补漆；19.2m屋面，保温板敷设、钢筋网绑扎；地下室电力桥；夹层桥架安装、排水管安装；夹层套管封堵，夹层进户箱开槽；污水排水管道管卡安装；楼梯间抹灰，外墙保温板，地下室卫生间、淋浴间地面防水铺贴；消防：地下室喷淋支管及支吊架制作安装；一层及一层夹层消火栓箱固定安装；一层夹层消火栓支管接入箱内安装；暖通一楼下料（风管吊装横担），二楼标识洞口。幕墙：东面 9.1 米 以下外立面钢龙骨安装，二层以上钢架安装；南面钢架安装；北面钢架安装；西边钢架安装；二层东西面玻璃幕墙龙骨施工，南北两边屋面悬挑梁钢龙骨安装 。 二、跟审人员配备 公司主管领导：朱超文，13871107369 ；项目负责人：官平，15907199225 ；项目主审人：秦祖娟13971592378；现场跟审人：胡建华，1333992065 。 项目负责人及项目主审人每周去项目至少一次，现场跟审人每天驻守项目。现场每天都有人值守，确保随叫随到，服务至上。 三、本周工作内容： （一）资料收集情况 本周通过与施工、监理单位对接，收集到了如下资料： 1、本周参加施工单位安全周检查； 2、拍摄现场施工图片 6.0张； 3、参加监理例会。 （二）沟通交流情况： 1、本周检查消防材料品牌； 2、现场踏勘结构楼面标高与建筑标高； （三）存在问题及建议 1、建议总包单位与精装单位场地交接办理交接手续； 2、注意高温天气的及时发放防中暑医药； 3、建议外脚手架拆除后的临边防护。		
	武汉华隆工程造价咨询有限公司 项目负责人（签字）：官平 日期：2025 年7月21日		

第(65)期周报附图

一、盘扣归堆退场



二、地下室排水沟施工




三、南边檐口骨架



四、腻子粉进场



五、东边幕墙骨架

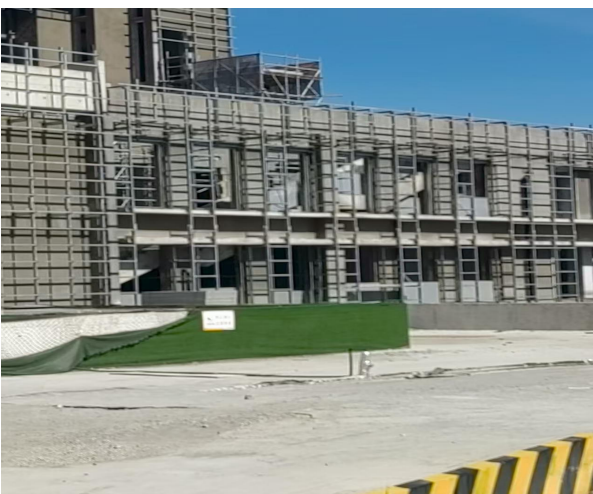

六、地下室楼梯间抹灰

