


建设工程施工过程跟踪审核周报

编号: 武华【2024】074


工程名称	武汉学院二期体育馆项目	建设单位	武汉学院
施工单位	武汉建工	监理单位	湖北新天地工程建设监理有限责任公司
咨询内容	第(74)期周报		
咨询单位意见 单 位 意 见	<p>一、项目概况</p> <p>体育馆项目位于东门北侧，地下1层，地上2层，夹层1层，建筑总高度22.2米。体育馆规划总建筑面积23797.34m²，其中地上建筑面积13795.46m²，地下体育用房4204.54m²，场地架空1664.88m²，地下停车及设备房4132.46m²。</p> <p>本期2025年9月15日至2025年9月21日，总包：屋面防水保护层抹灰，地下室水沟抹灰，夹层电箱安装，一层封堵，地下北边污水排水管安装，地下室羽毛球场排水管安装，地下室羽毛球场热水机房给水管安装。消防：二层喷淋系统水压试验准备工作，消防水系统处理第三方检查质量问题，蓝球馆看台地导灯底盒安装，防排烟系统处理第三方检查质量问题。幕墙：东面9.1米以下外立面钢龙骨加焊，东面门厅钢架安装；南面钢架加焊。北面钢架加焊。西边钢架9.1米以下施工，南北两边屋面悬挑梁钢龙骨；屋面天沟骨架安装；暖通：东南边管井钢管焊接，一层篮球馆风管拼装。精装：油漆工楼梯墙面石膏抹灰，电焊工焊负一楼转换层，夹层样板间封石膏板，走道铝板吊顶龙骨安装，夹层走道第二遍腻子，一层卫生间给水管敷设。</p> <p>二、跟审人员配备</p> <p>公司主管领导：朱超文，13871107369；项目负责人：官平，15907199225；项目主审人：秦祖娟13971592378；现场跟审人：胡建华，1333992065。</p> <p>项目负责人及项目主审人每周去项目至少一次，现场跟审人每天驻守项目。现场每天都有人值守，确保随叫随到，服务至上。</p> <p>三、本周工作内容：</p> <p>(一) 资料收集情况</p> <p>本周通过与施工、监理单位对接，收集到了如下资料：</p> <ol style="list-style-type: none">本周参加施工单位安全周检查；拍摄现场施工图片6.0张；参加监理例会。 <p>(二) 沟通交流情况：</p> <ol style="list-style-type: none">本周检查风管支架固定间距；本周检查轻钢龙骨的水平高度； <p>(三) 存在问题及建议</p> <ol style="list-style-type: none">建议注意各工种配合作业；建议幕墙作业人员佩戴好安全带。		
	 <p>武汉华隆工程造价咨询有限公司</p>		
	<p>项目负责人(签字): 官平</p>		
	<p>日期: 2025年09月22日</p>		

第(74)期周报附图

一、屋面不锈钢天沟安装

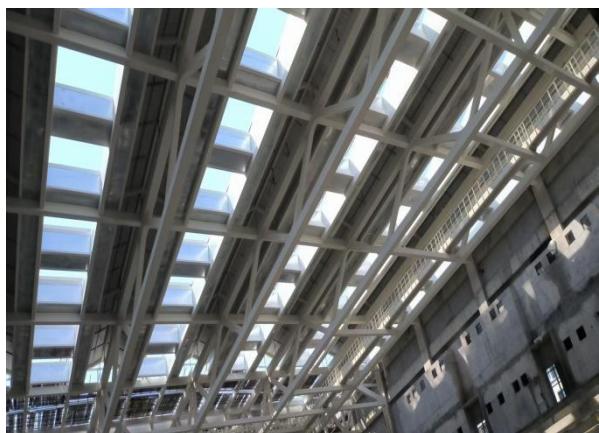


二、给水管件安装

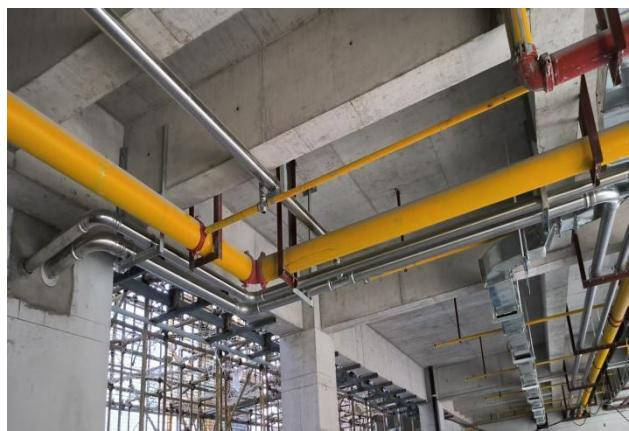

三、地面砖铺装样板



四、墙面龙骨安装

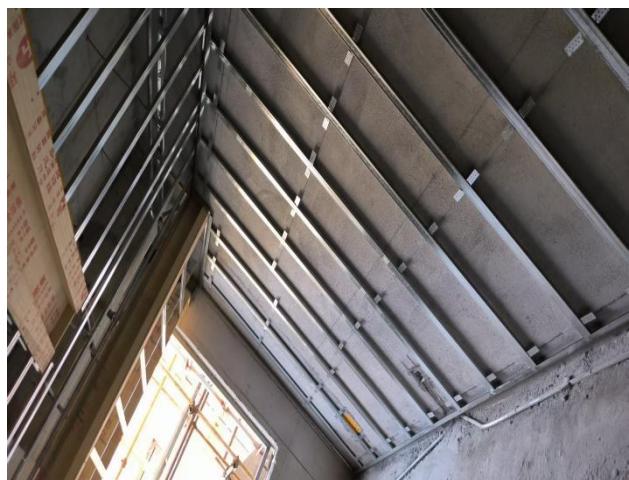

五、风管制作



六、吊顶石膏板安装

