

# 建设工程施工过程跟踪审核周报

编号: 武华【2024】078

工程名称	武汉学院二期体育馆项目	建设单位	武汉学院
施工单位	武汉建工	监理单位	湖北新天地工程建设监理有限责任公司
咨询内容	第(78)期周报		
咨询单位意见	<p><b>一、项目概况</b> 体育馆项目位于东门北侧，地下1层，地上2层，夹层1层，建筑总高度22.2米。体育馆规划总建筑面积23797.34m<sup>2</sup>，其中地上建筑面积13795.46m<sup>2</sup>，地下体育用房4204.54m<sup>2</sup>，场地架空1664.88m<sup>2</sup>，地下停车及设备房4132.46m<sup>2</sup>。</p> <p>本期2025年10月13日至2025年10月19日，二层卫生间给水验收，夹层天花龙骨基层验收。一层卫生间隐蔽工程验收，一层及夹层办公室局部吊顶施工，一层办公室吊顶木基层及龙骨安装，夹层走道吊顶安装丝杆龙骨，夹层地台砌体砌筑，一层办公室转换层施工，一层及夹层局部电路改造，水电工二层走道安装线管，油漆工二层刮走道粉刷石膏找平，负一层刮腻子，电焊工二层焊转换层、支架切割，木工安装乒乓球室玻镁板，焊东北角厕所转换层，篮球馆脚手架搭设。</p> <p><b>二、跟审人员配备</b></p> <p>公司主管领导：朱超文，13871107369；项目负责人：官平，15907199225；项目主审人：秦祖娟13971592378；现场跟审人：胡建华，1333992065。</p>		
	<p>项目负责人及项目主审人每周去项目至少一次，现场跟审人每天驻守项目。现场每天都有人值守，确保随叫随到，服务至上。</p> <p><b>三、本周工作内容：</b></p> <p>(一) 资料收集情况 本周通过与施工、监理单位对接，收集到了如下资料：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>本周参加施工单位安全周检查；</li><li>拍摄现场施工图片 6.0张；</li><li>参加监理例会。</li></ol> <p>(二) 沟通交流情况： 1、本周精装修合同内暂估价材料询价； 2、本周检查屋面防水层；</p> <p>(三) 存在问题及建议 1、建议篮球馆脚手架搭设的扫地杆加固； 2、建议消防新风口影响安装窗户的拆除重装。</p>		



日期: 2025 年10月20日

第(78)期周报附图

一、暖通保温




二、屋面防水检查



三、天棚补缝



四、暖通开孔、封孔

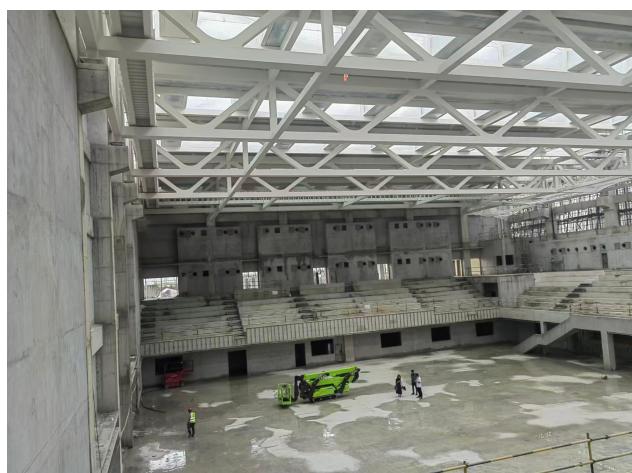

五、风管制作



六、看台墙面龙骨

