

建设工程施工过程跟踪审核周报

编号: 武华【2024】075

工程名称	武汉学院二期体育馆项目	建设单位	武汉学院
施工单位	武汉建工	监理单位	湖北新天地工程建设监理有限责任公司
咨询内容	第(75)期周报		
咨询单位意见	<p>一、项目概况</p> <p>体育馆项目位于东门北侧，地下1层，地上2层，夹层1层，建筑总高度22.2米。体育馆规划总建筑面积23797.34m²，其中地上建筑面积13795.46m²，地下体育用房4204.54m²，场地架空1664.88m²，地下停车及设备房4132.46m²。</p> <p>本期2025年9月22日至2025年9月28日，总包：看台抹灰，一层回填地下室羽毛球场雨水排水管安装，电井桥架安装，套管洞口封堵，地下室桥架防晃支架安装，空调冷凝水管改装。消防：二层喷淋系统水压试验准备工作，消防水系统处理第三方检查质量问题，篮球馆看台地导灯底盒安装，防排烟系统处理第三方检查质量问题。幕墙：屋面天沟安装，屋面天窗安装，暖通：东南边管井铜管焊接，二层风管拼装。精装：一层及夹层包管，夹层走道吊顶钻孔，夹层合唱排练室地台基层制作，篮球场区域吊顶龙骨安装，1层走道刮腻子，地下室排水管敷设，篮球场区域封洞口，地下室乒乓球馆刮腻子。</p> <p>二、跟审人员配备</p> <p>公司主管领导：朱超文，13871107369；项目负责人：官平，15907199225；项目主审人：秦祖娟13971592378；现场跟审人：胡建华，1333992065。</p> <p>项目负责人及项目主审人每周去项目至少一次，现场跟审人每天驻守项目。现场每天都有人值守，确保随叫随到，服务至上。</p> <p>三、本周工作内容：</p> <p>(一) 资料收集情况</p> <p>本周通过与施工、监理单位对接，收集到了如下资料：</p> <p>1、本周参加施工单位安全周检查；</p> <p>2、拍摄现场施工图片 6.0张；</p> <p>3、参加监理例会。</p> <p>(二) 沟通交流情况：</p> <p>1、本周检查风管支架固定间距；</p> <p>2、本周检查轻钢龙骨的水平高度；</p> <p>(三) 存在问题及建议</p> <p>1、建议装修方案调整及时办理联系函；</p> <p>2、建议涂料墙面被焊渣污染处及时处理。</p> <div><div>武汉华隆工程造价咨询有限公司</div><div>项目负责人（签字）：官平</div><div>日期：2025 年09月29日</div></div>		

## 第(75)期周报附图

一、屋面不锈钢天沟安装




二、设备房开设窗户(计4处)



三、暖通风管开洞,封闭预留



四、办公室吊顶样板(灯具需要增加)

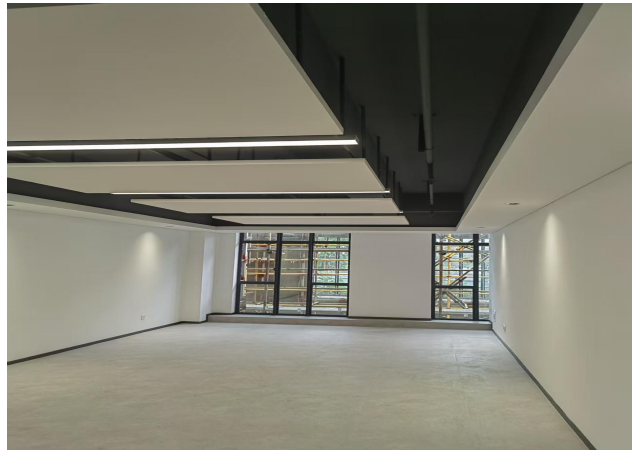

五、窗台铺贴地砖



六、二层走廊开窗4处

