建设工程施工过程跟踪审核周报

编号：武华【2024】054

工程名称	武汉学院二期体育馆项目	建设单位	武汉学院
施工单位	武汉建工	监理单位	湖北新天地工程建设监理有限责任公司
咨询内容	第（54）期周报		

咨询单位意见

一、项目概况

体育馆项目位于东门北侧，地下1层，地上2层，夹层1层，建筑总高度22.2米。体育馆规划总建筑面积23797.34㎡，其中地上建筑面积13795.46㎡，地下体育用房4204.54㎡，场地架空1664.88㎡，地下停车及设备房4132.46㎡。

本期2025年4月28日至2025年5月4日，屋面桁架吊装完成；大型吊车拆装，准备陆续退场；二层构造柱钢筋绑扎、植筋；二层反坎支模板、浇捣砼；一层墙体加气砼砌块砌筑；一层二次结构钢筋制作绑扎、支模板、浇捣二构砼；消防管道安装，管道支架安装。

二、跟审人员配备

公司主管领导：朱超文，13871107369 ；项目负责人：官平，15907199225 ；项目主审人：秦祖娟13971592378；现场跟审人：胡建华，1333992065 。

项目负责人及项目主审人每周去项目至少一次，现场跟审人每天驻守项目。现场每天都有人值守，确保随叫随到，服务至上。

三、本周工作内容：

（一）资料收集情况

本周通过与施工、监理单位对接，收集到了如下资料：

1、本周参加施工单位安全周检查；
2、拍摄现场施工图片 8.0张；
3、参加监理例会。

（二）沟通交流情况：

1、本周无特别沟通交流情况；

（三）存在问题及建议

1、建议施工单位二次构件植筋应做拉拔试验；
2、注意节期安全检查，主要负责人值班安排；
3、注意防范吊装设备拆除时的安全隐患。

武汉华隆工程造价咨询有限公司

项目负责人（签字）：官平

日期：2025 年5月5日

第（54）期周报附图

一、五一假期安全大检查

三、二层加气块砌筑

五、屋面桁架吊装完成

二、消防管及支架安装

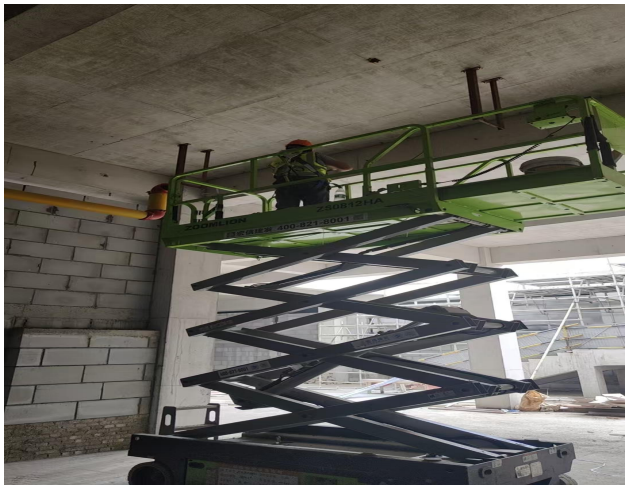

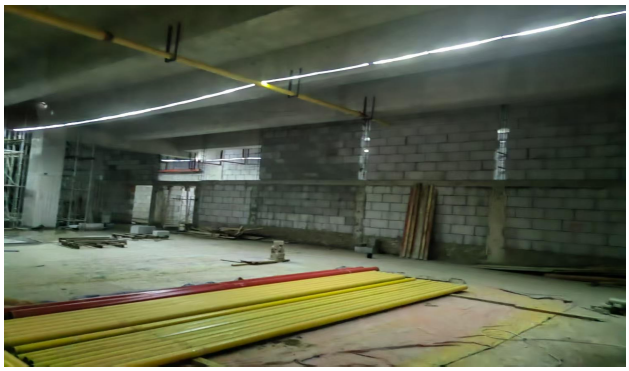

四、大型履带吊SANY（SCC5500A）拆装陆续退场
