建设工程施工过程跟踪审核周报

编号：武华【2024】070

工程名称	武汉学院二期体育馆项目	建设单位	武汉学院
施工单位	武汉建工	监理单位	湖北新天地工程建设监理有限责任公司
咨询内容	第（70）期周报		

咨询单位意见

一、项目概况

体育馆项目位于东门北侧，地下1层，地上2层，夹层1层，建筑总高度22.2米。体育馆规划总建筑面积23797.34㎡，其中地上建筑面积13795.46㎡，地下体育用房4204.54㎡，场地架空1664.88㎡，地下停车及设备房4132.46㎡。

本期2025年8月18日至2025年8月24日，总包：一层夹层地坪施工，地面清理；二层桥架安装;二层桥架安装，夹层排水管安装；一层夹层空调开关控制箱补槽。消防：二层消防弱电桥架安装，一层夹层消防弱电桥架安装；地下室防排烟风管安装，一层自动报警系统和应急照明系统穿线，二层消防弱电桥架安装；幕墙：东面 9.1 米以下外立面钢龙骨加焊 ，东面门厅钢架安装；南面钢架加焊 。北面钢架加焊。西边钢架 9.1 米以下施工；南北两边屋面悬挑梁钢龙骨；屋面天沟骨架安装；暖通：管井铜管安装，负一层K-D-3风管拼装；精装修：负一层走廊墙面石膏找平，一层夹层走廊墙面石膏找平，样板间施工，羽毛球馆墙面刮灰，器材存放室、负一层走道粉刷石膏找。

二、跟审人员配备

公司主管领导：朱超文，13871107369 ；项目负责人：官平，15907199225 ；项目主审人：秦祖娟13971592378；现场跟审人：胡建华，1333992065 。

项目负责人及项目主审人每周去项目至少一次，现场跟审人每天驻守项目。现场每天都有人值守，确保随叫随到，服务至上。

三、本周工作内容：

（一）资料收集情况

本周通过与施工、监理单位对接，收集到了如下资料：

1、本周参加施工单位安全周检查；
2、拍摄现场施工图片 6.0张；
3、参加监理例会。

（二）沟通交流情况：

1、本周检查地下室房间之间地坪高差；
2、本周检查消防材料品牌；

（三）存在问题及建议

1、建议检查幕墙螺栓、螺钉松动现象，杜绝发生松动；
2、建议各单位单位消杀蚊虫，谨防基孔肯雅热传染病传播；

武汉华隆工程造价咨询有限公司

项目负责人（签字）：官平

日期：2025 年8月25日

第（70）期周报附图

一、排水沟安装

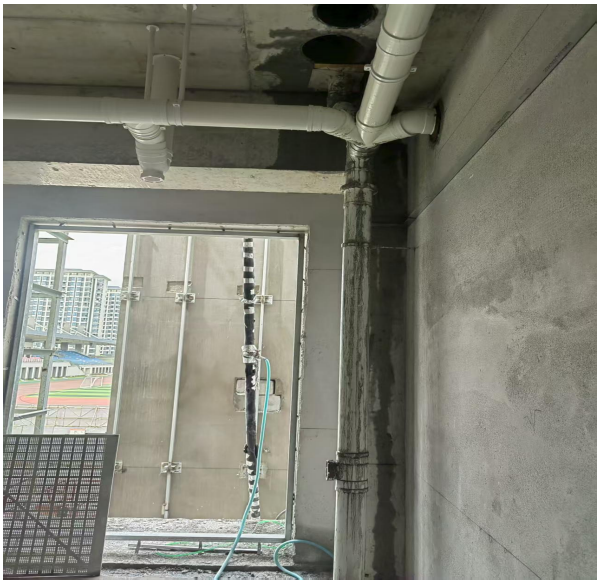

二、排烟风管安装

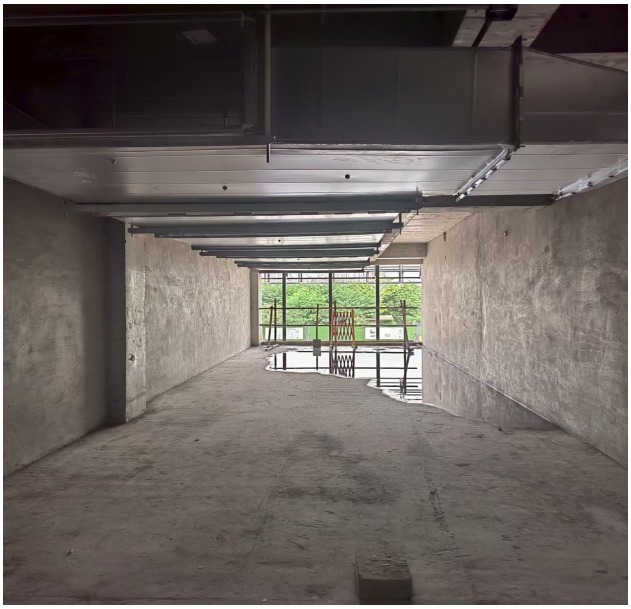

三、吊顶龙骨安装

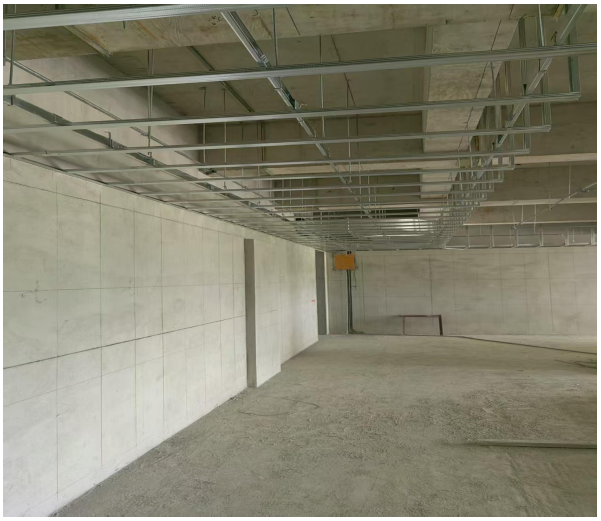

四、北边龙骨安装

五、地下室地面防水

六、看台下墙体抹灰
