建设工程施工过程跟踪审核周报

编号：武华【2024】063

工程名称	武汉学院二期体育馆项目	建设单位	武汉学院
施工单位	武汉建工	监理单位	湖北新天地工程建设监理有限责任公司
咨询内容	第（63）期周报		

咨询单位意见

一、项目概况

体育馆项目位于东门北侧，地下1层，地上2层，夹层1层，建筑总高度22.2米。体育馆规划总建筑面积23797.34㎡，其中地上建筑面积13795.46㎡，地下体育用房4204.54㎡，场地架空1664.88㎡，地下停车及设备房4132.46㎡。

本期2025年6月30日至2025年7月6日，屋面钢走道板焊接安装，天窗架吊装；幕墙龙骨制作、安装；幕墙高强螺栓安装幕墙预埋板；二层内墙面抹灰；一层外墙面抹灰；消防管道安装；屋面聚氨酯及卷材防水施工拆除运动场四周脚手架；室内天棚刮腻子。

二、跟审人员配备

公司主管领导：朱超文，13871107369 ；项目负责人：官平，15907199225 ；项目主审人：秦祖娟13971592378；现场跟审人：胡建华，1333992065 。

项目负责人及项目主审人每周去项目至少一次，现场跟审人每天驻守项目。现场每天都有人值守，确保随叫随到，服务至上。

三、本周工作内容：

（一）资料收集情况

本周通过与施工、监理单位对接，收集到了如下资料：

1、本周参加施工单位安全周检查；
2、拍摄现场施工图片 6.0张；
3、参加监理例会。

（二）沟通交流情况：

1、本周检查进场的强电材料的品牌；
2、现场踏勘结构楼面标高与建筑标高；

（三）存在问题及建议

1、建议强电材料依据合同约定的品牌采购；
2、注意高温天气的安全防范；
3、建议复测楼地面现有标高与设计建筑完成面标高的高差，做好记录。

武汉华隆工程造价咨询有限公司

项目负责人（签字）：官平

日期：2025 年7月6日

第（63）期周报附图

一、钢天窗架安装

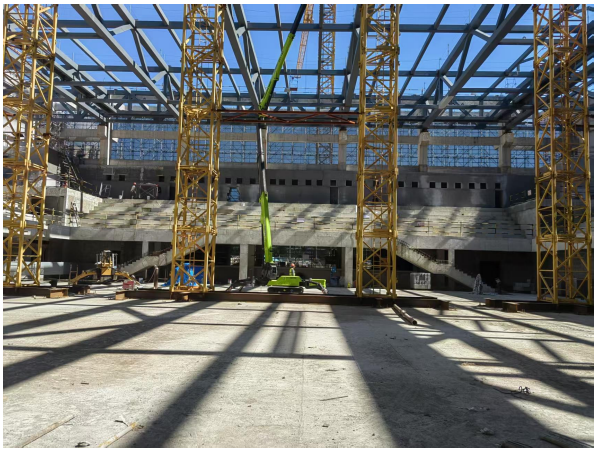

二、走廊内墙面满挂镀锌钢丝网

五、天棚刮腻子

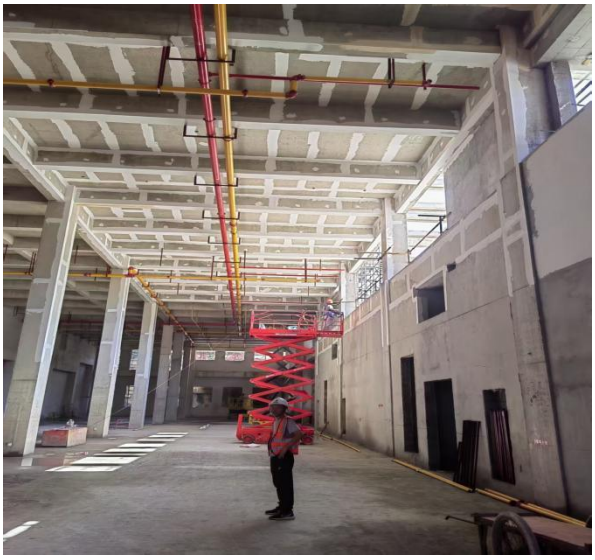

二、消防喷淋头

四、消防管件

六、调查复测楼地面结构标高与建筑标高的关系
